


# 済生会小樽病院新築工事進捗状況



平成24年11月7日

# 新済生会小樽病院 概要

- 敷地 小樽市築港 1 1 4 番 1
- 用途地域 医療・福祉関連サービス業務地区
- 敷地面積 1 9, 1 4 7 m<sup>2</sup>
- 構造・規模
  - 病院棟 : 鉄筋コンクリート造 5 階建
  - エネルギー棟 : 鉄筋コンクリート造 2 階建  
(延床面積 1 7, 7 0 0 m<sup>2</sup>)
  - 保育所棟 : 鉄筋コンクリート造平屋建  
(延床面積 2 2 2 m<sup>2</sup>)

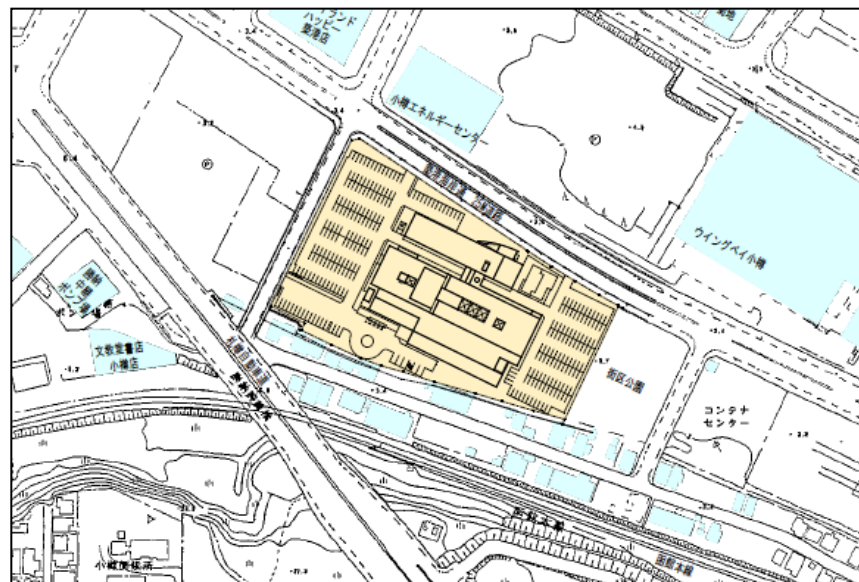

- 病院の概要
  - ・ 病床数  
2 5 8 床 (一般病床 2 0 8 床、回復期病床 5 0 床)
  - ・ 診療科目  
内科、消化器内科、循環器内科、神経内科、外科、消化器外科、整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、健診センター、透析センター
  - ・ 駐車施設  
一般用 1 4 8 台 (うち車椅子用 5 台)

# 新濟生会小樽病院 立面図



南 立面図(病院棟)



西 立面図(病院棟)



東 立面図(病院棟)



北 立面図(病院棟)

# 新済生会小樽病院 配置図



# 新済生会小樽病院 工事状況写真



平成23年12月(着工)



平成24年1月(仮設工事)



平成24年2月(山留工事・杭打設準備)



平成24年3月(杭打設)



平成24年4月(杭打設)



平成23年5月(基礎躯体・1階床躯体)



平成24年6月(1階立上・2階床躯体)



平成24年7月(2階立上・3階床躯体)



平成24年8月(3階立上・4階床躯体)



平成24年9月(4階立上・5階床躯体)



平成24年10月(5階立上・R階躯体)

# 新済生会小樽病院 工事工程

平成25年5月完成  
平成25年8月移転予定

